


INFORME DEL ESTADO DE INICIATIVAS DE INVERSIÓN

UNIDAD TÉCNICA DEL GOBIERNO REGIONAL



CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	3
2.	RESULTADO DE AVANCE	4
2.1.	ESTADO DE AVANCE, NUDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES O REALIZADAS.	4
2.2.	CANTIDAD DE INICIATIVAS POR ETAPA, TIPOLOGÍA Y COMUNA.	12
2.3.	PORCENTAJE FÍSICO Y FINANCIERO DE INICIATIVAS EN EJECUCIÓN	13
3.	CONCLUSIONES Y/O SÍNTESIS	14
4.	ANEXOS DIGITALES	14
•	PLANILLA CONTROL DE INICIATIVAS (EXCEL)	14
•	FICHAS DE LAS INICIATIVAS REPORTADAS (EXCEL)	14

N° INFORME	ELABORADO	APROBADO	PUBLICADO
5	14.11.2024	14.11.2024	18.11.2024

INFORME DEL ESTADO DE INICIATIVAS DE INVERSIÓN

UNIDAD TÉCNICA DEL GOBIERNO REGIONAL

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe ejecutivo tiene como objetivo general informar el estado de avance al **31 de octubre del 2024**, de todas aquellas iniciativas en desarrollo a cargo de División de Infraestructura y Transportes como Unidad Técnica¹ y/o División Técnica².

Por lo anterior, los objetivos específicos del presente informe ejecutivo son los siguientes:


- Informar el estado de avance, nudos críticos y/o gestiones pendientes o realizadas.
- Informar la Cantidad de iniciativas de inversión pública en desarrollo por etapa, tipología y comuna.
- Informar el porcentaje físico y financiero de avance para iniciativas en ejecución.

Para abordar los objetivos planteados en este informe ejecutivo, metodológicamente se establecieron tres tipologías priorizadas de desarrollo, que corresponden a las siguientes;

1. **Servicios Básicos:** Iniciativas de inversión en las áreas de Electrificación Rural y Alumbrado Público, Abastecimiento de Agua Potable, Saneamiento Sanitario, Residuos Sólidos y Redes de Gas Natural.
2. **Infraestructura y Equipos:** Iniciativas de inversión en Infraestructura y Equipamiento, y Adquisición de Equipos asociados o no a obras.
3. **Otros** (Subsidios, programas, estudios, entre otros, cuando corresponda).

Es importante destacar que, para efectos del presente reporte, se han estructurado las iniciativas de inversión pública para facilitar el seguimiento y reporte de las iniciativas así como la identificación de nudos en el proceso y estrategias para su gestión, en cinco (5) Etapas (**Figura 1**), que comprenden una serie de Hitos de Avance, con distintos niveles de complejidad técnica, financiera, administrativa, legal, y coordinaciones entre distintas entidades responsables para su materialización, desde la Unidad Formuladora, Unidad Evaluadora, Unidad Financiera, Unidad Técnica, entre otros.

Figura 1. Etapas e Hitos de Avance para el desarrollo de Iniciativas de Inversión Pública.

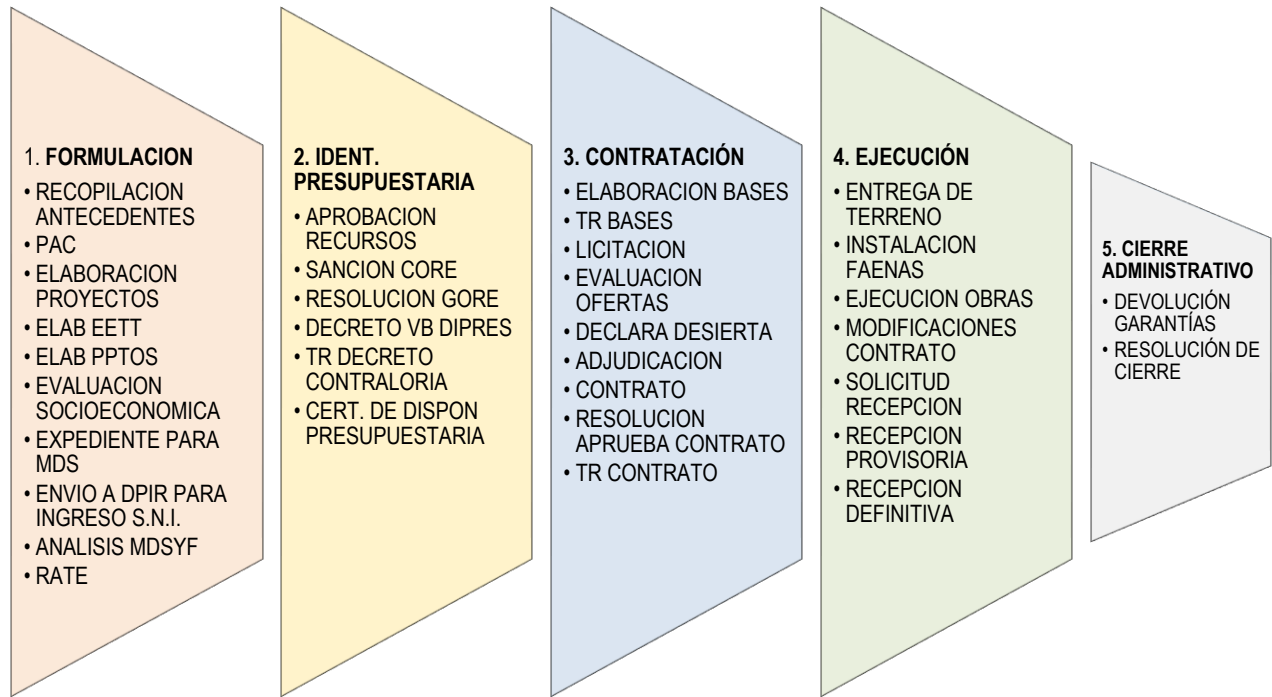

¹ Unidad Técnica; Encargada de formular, licitar, contratar y efectuar seguimiento de la ejecución hasta la liquidación del contrato.

² División Técnica; Encargada de coordinar las acciones de la Unidad Técnica mandatada en materias de infraestructura.

2. RESULTADO DE AVANCE

2.1. ESTADO DE AVANCE, NUDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES O REALIZADAS.

A continuación, se presenta el listado de iniciativas individualizando el estado de avance, nudos críticos y/o gestiones pendientes o realizadas de todas las iniciativas reportadas:

Tabla 1. Resumen Estado de Avance, Nudos y Gestiones

N°	COMUNA	TIPOLOGÍA INICIATIVA	NOMBRE DE LA INICIATIVA	ETAPA ACTUAL	HITO DE AVANCE	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO	DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE TÉCNICO	NUDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES O REALIZADAS
1	Punta Arenas	1. Servicios Básicos	CONSTRUCCIÓN SIST. RECOLECCIÓN DE AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, PUNTA ARENAS	4. EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA	76%	72%	Se mantiene suspensión de plazo de la consultoría de diseño en la Etapa 3 (total 4 etapas), ya que se debe obtener el RATE con RS que implican procesos a terceros como la aprobación DGA modificación de cauce. Se resuelve no ingreso a Evaluación Ambiental (SEA).	Aprobación de modificación de Cauce en la DGA.
2	Primavera	1. Servicios Básicos	HABILITACION Y MEJ. DE SIST. RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AA. SS. C. SOMBRERO	1. FORMULACIÓN	REEVALUACIÓN INICIATIVA	0%	0%	Se ingresó al BIP las respuestas a las observaciones del segundo FI del MDSyF.	A la espera de revisión de las respuestas a la segunda revisión del MDSyF. Se advierte que varias de las observaciones de la analista sobrepasan sus atribuciones y no apuntan necesariamente a la evaluación técnico económica de la iniciativa.
3	Punta Arenas	1. Servicios Básicos	CONSTRUCCIÓN RED DE GAS NATURAL SECTOR ANDINO, PUNTA ARENAS	4. EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA	92%	100%	En Red Terciario se están terminando los trabajos de instalación de acometidas residenciales. Se trabaja en la elaboración de mandatos junto con Gasco y Asesores	Con fecha 11.07.2024 se remitió a DPIR Memo (DIT) N° 113 solicitando ingreso al S.N.I. de la Reevaluación del proyecto, incorporando nuevos beneficiarios.

N°	COMUNA	TIPOLOGÍA INICIATIVA	NOMBRE DE LA INICIATIVA	ETAPA ACTUAL	HITO DE AVANCE	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO	DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE TÉCNICO	NUDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES O REALIZADAS
								del Proyecto, para la obtención de las servidumbres de paso.	Iniciativa se encuentra con RS y a la espera de sanción CORE
4	Punta Arenas	2. Infraestructura y Equipamiento	CONSERVACIÓN SEDES SOCIALES U.V. 21-48-49-59, P. ARENAS	5. CIERRE ADMINISTRATIVO	RESOLUCIÓN DE CIERRE	100%	100%	Cierre de Contrato aprobado por Resolución 317 del 08.07.2024.	JV Unidad 21 requiere intervención en cubierta y trabajos menores en otras sedes, al no poder ampliar el contrato original. Pendiente formas de financiamiento.
5	Punta Arenas	2. Infraestructura y Equipamiento	CONSERVACIÓN CIERROS PERIMETRALES EX HOSPITAL Y FACHADA ESC. ARTURO PRAT, P. ARENAS	5. CIERRE ADMINISTRATIVO	RESOLUCIÓN DE CIERRE	100%	100%	Cierre de Contrato aprobado por Resolución 318 del 08.07.2024.	No se presentan nudos críticos al presente reporte.
6	Natales	1. Servicios Básicos	REPOSICIÓN DE LUMINARIAS ALUMBRADO PÚBLICO PUERTO NATALES	3. CONTRATACIÓN	ELABORACION BASES	0%	0%	Resolución T.R. N° 83 fue ingresada a Contraloría el 14.08.2024, para toma de razón. Se responde observaciones emitidas por Contraloría Regional, mediante Res. Ex. N° 75 de fecha 09.09.2024. Con fecha 24.10.2024 se obtiene la toma de razón. En preparación antecedentes para enviar a publicar.	No se presentan nudos críticos al presente reporte.
7	Natales	1. Servicios Básicos	REPOSICIÓN DE SISTEMA DE GENERACIÓN DIÉSEL PUERTO EDÉN	1. FORMULACIÓN	ENVIO A DPIR PARA INGRESO S.N.I.	0%	0%	Mediante Memo DPIR N° 1134 de fecha 05.09.2024 se informa la aprobación del perfil de proyecto. Se licitará durante el mes de noviembre.	Es necesaria la Sala de Máquinas para la instalación de los equipos, la que aún se encuentra en proceso de formulación.
8	Punta Arenas	1. Servicios Básicos	CONSTRUCCIÓN PROYECTO ELECTRICO	4. EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA	65%	92%	Ejecutados en su totalidad 2 sectores del proyecto (Sector N°2 y N°3). Pendiente Sector	No se presentan nudos críticos al presente reporte.

Nº	COMUNA	TIPOLOGÍA INICIATIVA	NOMBRE DE LA INICIATIVA	ETAPA ACTUAL	HITO DE AVANCE	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO	DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE TÉCNICO	NUDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES O REALIZADAS
			PERIURBANO PONIENTE SECTOR ANDINO					1 (servidumbre de paso en proceso de elaboración por parte de la Empresa Eléctrica). Sector N°4: en proceso de ejecución de obras (a la fecha se considera un 65% de avance de las obras).	
9	Natales	1. Servicios Básicos	REPOSICIÓN SALA DE MÁQUINAS Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES	4. EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA	31%	26%	A licitar durante el mes de noviembre.	Se encuentra en proceso de cotizaciones por los costos del nuevo diseño. Se estima que el proyecto signifique una reevaluación.
10	Porvenir	2. Infraestructura y Equipamiento	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS TIERRA DEL FUEGO	4. EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA	85%	90%	Ejecución Etapa 3.3C de 4. Permisos Sectoriales Aprobados. En planificación Participación Ciudadana con feria ambiental incluida para llegar a la mayor cantidad de público (niños: pre-escolar, escolar básica y media; adultos: técnicos y profesionales, sector privado y público, otros)	Se han obtenido 13 Permisos Sectoriales de 14. Las tramitaciones iniciaron en agosto del 2023, en su mayoría dependientes de la Seremi de Salud, institución donde se mantiene en revisión el PAS 141 (construcción relleno sanitario).
11	Punta Arenas	2. Infraestructura y Equipamiento	CONSTRUCCION CENTRO DE GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS, MAGALLANES	4. EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA	40%	36%	Se suspende plazo de ejecución de proyecto a la espera de propuesta técnica de parte del consultor para complementar levantamiento hidrológico e hidrogeológico en áreas críticas del proyecto, determinantes para la ingeniería de detalles.	Se actualizó documento de garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, sin embargo, se encuentra pendiente la regularización del mismo, debido a la necesidad de complementar antecedentes hídricos, lo que modificará orden y cantidad de productos y plazos de ejecución.

N°	COMUNA	TIPOLOGÍA INICIATIVA	NOMBRE DE LA INICIATIVA	ETAPA ACTUAL	HITO DE AVANCE	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO	DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE TÉCNICO	NUDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES O REALIZADAS
12	Natales	2. Infraestructura y Equipamiento	ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS, PUERTO EDÉN	4. EJECUCIÓN	OTROS	79%	79%	Se encuentra a la espera de ejecutar proyecto de habilitación / conservación del inmueble para dar continuidad con la compra de equipos que se encuentra pendiente.	Aún se mantiene pendiente el proceso de conservación del inmueble, para finalizar con el proyecto de habilitación.
13	Natales	2. Infraestructura y Equipamiento	ADQUISICIÓN EMBARCACIÓN APOYO LOGISTICO Y DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS PUERTO EDÉN	2. IDENT. PRESUPUESTARIA	APROBACION RECURSOS	0%	0%	Enviado a evaluación DPIR por Memo (DIT) N° 14 del 22.01.2024. Por oficio Ord (DPIR) 754 del 22.07.2024 se informa aprobación sin observaciones de la iniciativa.	A la espera la creación de asignación presupuestaria para poder licitar la adquisición.
14	Natales	2. Infraestructura y Equipamiento	REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN PASARELAS SECTOR ALTO PUERTO EDÉN	4. EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA	31%	31%	Suministro Madera Ítem N°2: Se encuentra a la espera de una redistribución de materiales en el área de almacenamiento para lograr la recepción total del suministro pendiente por parte del proveedor Jorge Mansilla. No obstante, sigue en curso contrato de Servicio de Bodeguero y arrendamiento explanada EPA. Se contrata servicio de trazado, nivelación y AITO. - Contratación de Asesoría: En Ejecución (Inicio Contrato 29.10.2024)	Los materiales se están acopiando en la explanada del terminal portuario. Conforme a ello, se suscribió Contrato (C6) de Arriendo con la Empresa Portuaria Austral, administradora del terminal portuario para almacenamiento de materiales. Por otra parte, la capacidad de almacenamiento estaba al límite de su capacidad, por la cual se efectuó la redistribución de materiales en el área de almacenamiento del terminal portuario por medio de un servicio conexo al contrato (C5 - Servicio Bodeguero hasta 28.12.2024).

N°	COMUNA	TIPOLOGÍA INICIATIVA	NOMBRE DE LA INICIATIVA	ETAPA ACTUAL	HITO DE AVANCE	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO	DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE TÉCNICO	NUDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES O REALIZADAS
15	Natales	2. Infraestructura y Equipamiento	CONSTRUCCIÓN PLAZAS DE JUEGOS INFANTILES, PUERTO EDEN	4. EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA	61%	61%	Se encuentra en suspensión el contrato de mano de obra de cubiertas de plaza de juegos (C7). Mediante Resolución Ex. (GR) N°445 de 27.09.2024 se efectúa trato directo - TD por maderas para cubiertas Juegos Infantiles no obtenidas en licitaciones por \$14.516.969. Contrato C10 en ejecución. -Último Término Cubiertas: 20-09-2024. Se encuentra suspendido desde el 16-09-2024 - Término Entrega Suministro Madera (Forestal Los Robles):19.11.2024	Condiciones Climáticas en sector de extracción impide una pronta entrega de materiales (C6). Múltiples licitaciones para completar la obra.
16	Laguna Blanca	1. Servicios Básicos	REPOSICIÓN GRUPOS ELECTRÓGENOS LAGUNA BLANCA	5. CIERRE ADMINISTRATIVO	DEVOLUCIÓN GARANTÍAS	100%	100%	La ejecución finalizó el 20.10.2023. El Proyecto se encuentra terminado con recepción definitiva. La garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato. se encuentra vencida desde el 24.01.2024, la que debe ser devuelta por la DAF del GORE, mediante gestiones de la DIT y la DPIR.	No se presentan nudos críticos al presente reporte.
17	Natales	2. Infraestructura y Equipamiento	ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO Y HABILITACION COMUNITARIA, PUERTO EDEN	4. EJECUCIÓN	OPERACIÓN	100%	100%	Obras terminadas y en operación. Considera un servicio por un año con término en noviembre de 2024.	No se presentan nudos críticos a la fecha del presente reporte.

N°	COMUNA	TIPOLOGÍA INICIATIVA	NOMBRE DE LA INICIATIVA	ETAPA ACTUAL	HITO DE AVANCE	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO	DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE TÉCNICO	NUDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES O REALIZADAS
18	Punta Arenas	1. Servicios Básicos	CONSTRUCCION RED DE GAS NATURAL OJO BUENO - CALAFATE - ROBEDAL, PUNTA ARENAS	3. CONTRATACIÓN	CONTRATO	0%	0%	Ley N° 21.688 del 9.8.2024 que modifica las glosas de la Ley de Presupuestos 2024 clasifica en Subtítulo 33 el financiamiento de iniciativas por la vía del subsidio, por lo que se debe firmar un nuevo Convenio entre GORE y GASCO con fecha 19.08.2024.	Con fecha 15.10.2024 el Consejo Regional aprobó moción 216 por la cual se aprueba incremento de M\$ 1 al Sub 33, ítem 03, Asig. 075 asociadas a Transferencias de Capital para la iniciativa. A la espera del Decreto correspondiente, con el cual se podrá reingresar a Contraloría la Resolución que Aprueba el Convenio de Subsidio.
19	Natales	1. Servicios Básicos	CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL RUTA 9 NORTE - CRUCE RUTA 250 CH, NATALES	5. CIERRE ADMINISTRATIVO	DEVOLUCIÓN GARANTÍAS	100%	100%	Obras terminadas. Acta de Recepción de obras fue firmada con fecha 17.04.2024. En DPIR se encuentra la gestión de entrega de boletas de garantías.	No se presentan nudos críticos al presente reporte.
20	Punta Arenas	1. Servicios Básicos	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VARIOS SECTORES, PUNTA ARENAS	1. FORMULACIÓN	EXPEDIENTE PARA MDS	0%	0%	A la espera que AMA subsane las observaciones presentadas por el RATE.	Alta cantidad de tiempo de respuesta por parte de AMA.
21	Punta Arenas	1. Servicios Básicos	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR PAMPA REDONDA BAJO, PUNTA ARENAS	3. CONTRATACIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA	5%	0%	Reevaluación de proyecto con RS. CORE aprueba incremento de recursos. Se adjudica a Hidrosan Ingeniería, quienes desarrollan Plan de trabajo de acuerdo a propuesta técnica aprobada por la UT.	No se presentan nudos críticos al presente reporte.
22	Natales	3. Otros - Estudios	DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL PARA IMPLEMENTACIÓN DE	1. FORMULACIÓN	ELABORACION PROYECTOS	0%	0%	En elaboración de Consulta de Pertinencia para ingreso a evaluación al SEA	Reuniones con Min. Energía y otros servicios para la factibilidad técnica del proyecto


Nº	COMUNA	TIPOLOGÍA INICIATIVA	NOMBRE DE LA INICIATIVA	ETAPA ACTUAL	HITO DE AVANCE	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO	DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE TÉCNICO	NUDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES O REALIZADAS
			INFRAESTRUCTURA, PUERTO EDÉN						
23	Punta Arenas	1. Servicios Básicos	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR RINCÓN CHILENO LYNCH - CAMINOS 18 - 19 PUNTA ARENAS	4. EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA	10%	0%	Obras en ejecución. A la espera de la boleta de garantía por concepto de pago de anticipo de subsidio, para la posterior tramitación del estado de pago.	No se presentan nudos críticos al presente reporte.
24	Punta Arenas	2. Infraestructura y Equipamiento	ADQUISICIÓN INSTRUMENTOS Y EQUIPOS U.T. GOBIERNO REGIONAL	4. EJECUCIÓN	OTROS	63%	63%	Con fecha 25.10.2024 se levanta licitación pública 1609-34-LE24, mediante Resolución Ex. (GR) N°473 de 15.09.2024 que aprueba bases de licitación pública de la iniciativa para el suministro de equipos y software denominada "Adquisición notebook y software para el apoyo del Plan de Zonas de Rezago", con un presupuesto total estimado de \$5.620.000. Fecha de adjudicación 14.11.2024.	Durante las licitaciones anteriores han existido dificultades para obtener ofertas de equipos con las características requeridas. Además, de escasos proveedores que trabajen con Mercado Público. Última licitación de agosto se declaró desierta.
25	Punta Arenas	3. Otros - Programas	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VIVIENDAS SECTORES PERIURBANOS, PUNTA ARENAS	3. CONTRATACIÓN	CONTRATO	0%	0%	Convenio en Contraloría para toma de razón.	La demora en los trámites administrativos posteriores a la recomendación por parte de DPIR, podrían implicar una desprogramación de los equipos de trabajo de la UMAG.
26	Punta Arenas	1. Servicios Básicos	INSTALACION SISTEMAS AUTOGENERACIÓN RUTA 9 SUR KM 37,5 - 52 PUNTA ARENAS	1. FORMULACIÓN	ENVIO A DPIR PARA INGRESO S.N.I.	0%	0%	De acuerdo con Of. Ord. N° 224/2024, de fecha 20.02.2024 del Ministerio de Energía, que informa sobre modificación en la Ley General de Servicios	Iniciativa deberá esperar resultado de gestiones con Edelmag, empresa se encuentra analizando inversiones que podrían factibilizar el proyecto.

N°	COMUNA	TIPOLOGÍA INICIATIVA	NOMBRE DE LA INICIATIVA	ETAPA ACTUAL	HITO DE AVANCE	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO	DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE TÉCNICO	NUDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES O REALIZADAS
								Eléctricos y su efecto en la formulación y ejecución de proyectos de electrificación rural, mediante extensión de redes eléctricas y financiados con recursos del FNDR, se procederá a reevaluar la alternativa de extensión de red sector sur. En recopilación de nuevos beneficiarios del sector y factibilidad técnica con la empresa eléctrica EDELMAG.	
27	Punta Arenas	2. Infraestructura y Equipamiento	CONSERVACIÓN SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS N°20 "SECTOR FISCAL", PUNTA ARENAS	4. EJECUCIÓN	EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA	0%	0%	Con fecha 15.10.2024 se aprueba licitación pública "Conservación Sede Social Junta de Vecinos N°20 Sector Fiscal, Punta Arenas" - Segundo Llamado, mediante Resolución Ex. (GR) N° 470/2024 para el ID 1609-21-LE24, por la suma de \$106.522.850 y un plazo de ejecución de 80 días.	No se presentan nudos críticos a la fecha del presente reporte.
28	Punta Arenas	2. Infraestructura y Equipamiento	HABILITACION TERRENO Y DEMOLICION EX HOSPITAL REGIONAL, DR. LAUTARO NAVARRO, PUNTA ARENAS	3. CONTRATACIÓN	LICITACION	0%	0%	En proceso de licitación pública. Mediante Resolución TR N°82 se aprueban bases administrativas, técnicas y anexos para licitación pública. Posteriormente, se aprueba mediante Resolución TR 108, modificación de Bases Administrativas y nuevo plazo de cierre y adjudicación.	No se presentan nudos críticos al presente reporte.

2.2. CANTIDAD DE INICIATIVAS POR ETAPA, TIPOLOGÍA Y COMUNA.


En conformidad a lo presentado en el acápite 2.1, a la fecha del presente reporte de avance, la División de Infraestructura y Transportes (DIT) del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, tiene en desarrollo un total de **veintiocho (28) iniciativas**, distribuidas en distintas etapas de acuerdo a la siguiente gráfica:

Gráfico 1. Total de iniciativas por Etapas

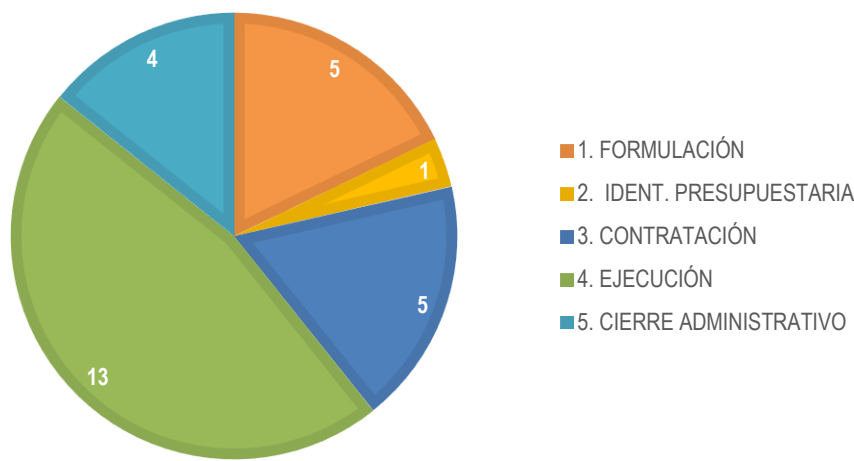

Del total de iniciativas en desarrollo, a continuación, se presentan el total de estas clasificadas por tipología y por comunas de la región donde inciden:

Gráfico 2. Total de iniciativas por tipología y comuna

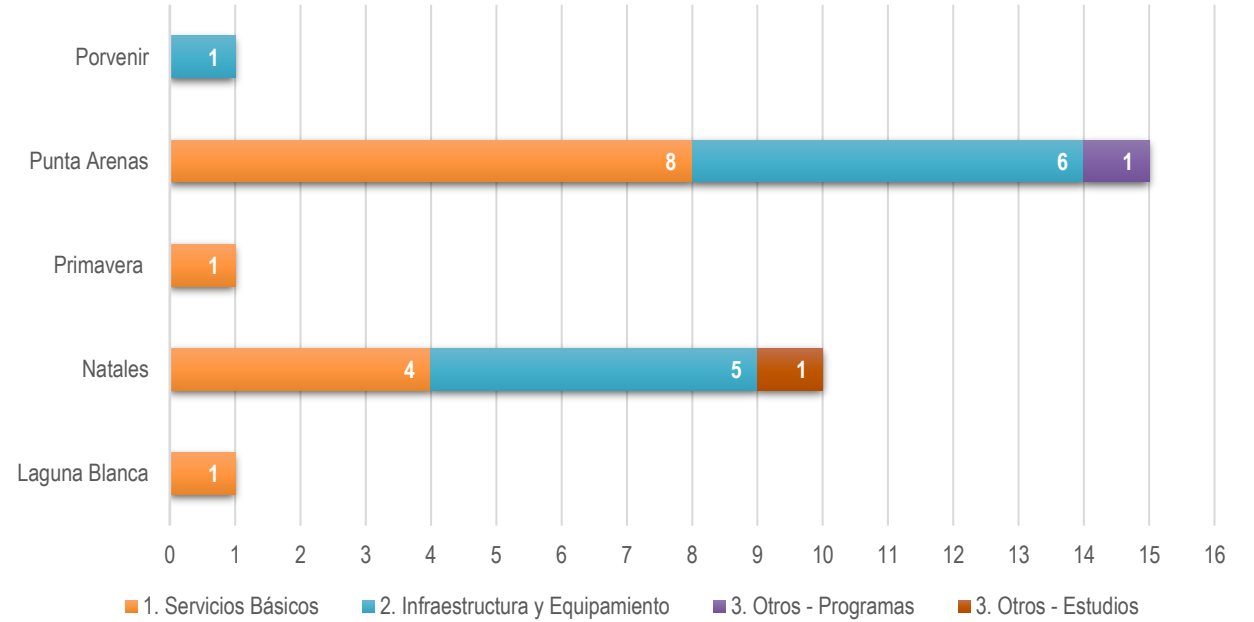

En los Anexos, se encuentra individualizado el detalle de cada una de las iniciativas para mayor información.

2.3. PORCENTAJE FÍSICO Y FINANCIERO DE INICIATIVAS EN EJECUCIÓN

Por otra parte, en conformidad a lo presentado en el acápite 2.1, el porcentaje promedio de avance técnico o físico para iniciativas en etapa de ejecución es de un **71%**, y el porcentaje promedio de avance Financiero para iniciativas en etapa de ejecución es de un **70%**. El porcentaje físico y financiero individualizado de cada iniciativa se presenta a continuación:

Gráfico 3. Porcentaje de avance Físico y Financiero iniciativas 2024 - DIT



En los Anexos, se encuentra individualizado el detalle de cada una de las iniciativas para mayor información.



3. CONCLUSIONES Y/O SÍNTESIS

El presente reporte da cuenta del total de iniciativas de inversión pública en desarrollo por parte de la División de Infraestructura y Transportes (DIT), además de sus porcentajes de avance físico –financiero, su estado de avance, sus nudos y gestiones.

En conclusión, el estado de avance es el siguiente:

CANTIDAD DE INICIATIVAS	NUDOS Y GESTIONES	INICIATIVAS EN EJECUCIÓN	PORCENTAJE FÍSICO (EJECUCIÓN)	PORCENTAJE FINANCIERO (EJECUCIÓN)
28	18	13	56 %	58%

El total de cartera de inversiones conformada por 28 iniciativas (Formulación, Asignación Presupuestaria, Contratación, Ejecución y Cierre), se proyecta con un total estimado de **M\$ 21.291.782**, las que se encuentran en distintas etapas de avance.

No obstante, los Contratos vigentes (en etapa de Contratación y Ejecución) alcanzan los **M\$ 5.714.755**, con una ejecución financiera a la fecha de **M\$ 4.606.391**

4. ANEXOS DIGITALES

- PLANILLA CONTROL DE INICIATIVAS (EXCEL)
- FICHAS DE LAS INICIATIVAS REPORTADAS (EXCEL)
